

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
EMPRESA: EXA TEC GRUPO ELECTRICO.
REP: LEGAL: C. IDHALI VIRIDIANA MITRE OJEDA
DIRECCIÓN: C. CEREZO # 204, FRACC. LOS ARBOLITOS 1, DURANGO, DGO.
C.P.: 34225
E-MAIL: exatec Ventas@hotmail.com
TEL: (618)-876-81-51

LUGAR: SAN JUAN DEL RIO
ESTADO: DURANGO
FECHA: 18/07/2017
PERIODO: DEL 18 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2017
CLIENTE: PRES. MPAL. SAN JUAN DEL RIO
No. EST: 1

ESTIMACIÓN

OBRA:												
AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA COLONIA LOS REMEDIOS												
ESTIMACION No.		CONTRATO	MONDO TONTRATADO SIN IVA		MONTO DE ANTICIPO CON IVA			PERIODO DE ESTIMACIÓN				
1		OP-SJR-R33-005/2017	\$	280,333.62	\$	-	DEL: 19-jun-17 AL: 09-jul-17					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES PRESUPUESTO	P.U.	IMPORTE PRESUPUESTO	ACUM. ANT	ESTA ESTIMACIÓN	VOL. ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE DE ESTIMACIÓN		
ELEC-001	Trazo y localización de red de distribución.	est.	10.00	\$ 195.15	\$ 1,951.50	0.00	10.00	10.00	0.00	\$ 1,951.50		
ELEC-002	Cepa para poste de 12.00 m.	pza	6.00	\$ 624.07	\$ 3,744.42	0.00	6.00	6.00	0.00	\$ 3,744.42		
ELEC-003	Cepa para poste de 9.00 m.	pza	4.00	\$ 516.23	\$ 2,064.92	0.00	4.00	4.00	0.00	\$ 2,064.92		
ELEC-004	Excavación de cepa para ancla de retenida (de ancla o ahogada).	pza	4.00	\$ 961.19	\$ 3,844.76	0.00	4.00	4.00	0.00	\$ 3,844.76		
ELEC-005	Suministro y colocación de POSTE DE CONCRETO PCR 12-750, en terreno tipo "C". Incluye: aviso de prueba, materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	6.00	\$ 7,399.13	\$ 44,394.78	0.00	6.00	6.00	0.00	\$ 44,394.78		
ELEC-006	Suministro y colocación de POSTE DE CONCRETO PCR 9-750, en terreno tipo "C". Incluye: aviso de prueba, materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	4.00	\$ 4,032.18	\$ 16,128.72	0.00	4.00	4.00	0.00	\$ 16,128.72		
ELEC-007	Suministro e instalación de bajante a tierra para POSTE DE CONCRETO PCR 12-750. Incluye: aviso de prueba, materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	2.00	\$ 1,259.96	\$ 2,519.92	0.00	2.00	2.00	0.00	\$ 2,519.92		

OBRA:										
AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS REMEDIOS										
ESTIMACION No.		CONTRATO	MONDO TONTRATADO SIN IVA		MONTO DE ANTICIPO CON IVA		PERIODO DE ESTIMACIÓN			
1		OP-SJR-R33-005/2017	\$	280,333.62	\$	-	DEL: 19-jun-17	AL: 09-jul-17		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES PRESUPUESTO	P.U.	IMPORTE PRESUPUESTO	CUM. ANT.	ESTA ESTIMACIÓN	VOL. ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE DE ESTIMACIÓN
ELEC-008	Suministro e instalación de bajante a tierra para POSTE DE CONCRETO PCR 9-750. Incluye: aviso de prueba, materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	1.00	\$ 1,207.16	\$ 1,207.16	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 1,207.16
ELEC-009	Suministro y vestido de ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO RD3N. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	est	2.00	\$ 4,893.25	\$ 9,786.50	0.00	2.00	2.00	0.00	\$ 9,786.50
ELEC-010	Suministro y vestido de ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO TS3N. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	est	4.00	\$ 3,304.47	\$ 13,217.88	0.00	4.00	4.00	0.00	\$ 13,217.88
ELEC-011	Suministro y vestido de ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO 1P3. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	est	2.00	\$ 899.67	\$ 1,799.34	0.00	2.00	2.00	0.00	\$ 1,799.34
ELEC-012	Suministro y vestido de ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO 1R3. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	est	2.00	\$ 906.25	\$ 1,812.50	0.00	2.00	2.00	0.00	\$ 1,812.50
ELEC-013	Suministro y vestido de ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO 2R3. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	est	1.00	\$ 1,624.62	\$ 1,624.62	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 1,624.62
ELEC-014	Suministro e instalación de RETENIDA RSAs. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	3.00	\$ 2,057.53	\$ 6,172.59	0.00	3.00	3.00	0.00	\$ 6,172.59
ELEC-015	Suministro e instalación de RETENIDA RDA. Incluye: materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	1.00	\$ 2,844.51	\$ 2,844.51	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 2,844.51
ELEC-016	Tendido y tensionado de CONDUCTOR PRIMARIO 3F-4H. Incluye: material, acarreo, fletes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	300.00	\$ 90.75	\$ 27,225.00	0.00	300.00	300.00	0.00	\$ 27,225.00
ELEC-017	Tendido y tensionado de CONDUCTOR SECUNDARIO. Incluye: material, acarreo, fletes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	360.00	\$ 54.70	\$ 19,692.00	0.00	360.00	360.00	0.00	\$ 19,692.00
ELEC-018	Suministro e instalación de BANCOS DE TRANSFORMACIÓN Y PRUEBAS.	jgo	1.00	\$ 53,947.32	\$ 53,947.32	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 53,947.32

OBRA: AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS REMEDIOS									
ESTIMACIÓN No.	CONTRATO	MONDO CONTRATADO SIN IVA	P.U.	IMPORTE PRESUPUESTO	ACUM. ANT	ESTA ESTIMACIÓN	VOL. ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE DE ESTIMACIÓN
1	OP-SJR-R33-005/2017	\$	280,333.62	\$					19-jun-17 09-jul-17
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES PRESUPUESTO	IMPORTE PRESUPUESTO	ACUM. ANT	ESTA ESTIMACIÓN	VOL. ACUMULADO	EXCEDENTE	IMPORTE DE ESTIMACIÓN
ELEC-019	Suministro e instalación de CORTA CIRCUITOS FUSIBLES.	lgo	2.00	\$ 12,038.90	0.00	2.00	2.00	0.00	\$ 24,077.80
ELEC-020	Planos definitivos en AUTOCAD y DEPRORAD.	proyecto	1.00	\$ 5,729.55	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 5,729.55
ELEC-021	Tramites necesarios ante CFE para proyecto AMPLIACIÓN DE OBRA ELÉCTRICA LOS REMEDIOS.	lote	1.00	\$ 15,123.24	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 15,123.24
ELEC-022	SIGLA 03 CFE	lote	1.00	\$ 6,301.35	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 6,301.35
ELEC-023	PAGO DE PUENTES PRIMARIOS	lote	1.00	\$ 15,123.24	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 15,123.24
				TOTAL DE IMPORTE: \$ 280,333.62		TOTAL DE ESTIMACIÓN			
						SUBTOTAL 1: \$ 280,333.62			
						I.V.A.: \$ 44,853.38			
						SUBTOTAL 2: \$ 325,187.00			
						5 AL MILLAR: \$ 1,401.67			
						TOTAL: \$ 323,785.33			

C. IDHALI VIRGINIA MITRE OJEDA
CONTRATISTA

C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIR. OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SAN JUAN DEL RIO



NOMBRE O RAZON SOCIAL:
EMPRESA: EXA TEC GRUPO ELECTRICO,
REP: LEGAL: C. IDHAI VIRIDIANA MITRE OJEDA
DIRECCION: C. CEREZO # 204, FRACC. LOS ARBOLITOS 1, DURANGO DGO.
C.P.: 34225
E-MAIL: oxaltec_yerles@hotmail.com
TEL: 610-876-151

LUGAR: SAN JUAN DEL RIO
ESTADO: DURANGO
FECHA: 18/07/2017
PERIODO: DEL 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2017
CLIENTE: PRES. MPAL. SAN JUAN DEL RIO
No. EST: 1

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:			
AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA LOS REMEDIOS			
ESTIMACION A	CONTRATO	MONDO CONTRATADO SIN IVA	MONTO DE ANTICIPO CON IVA
1	OP-SJR-R33-005/2017	\$280,333.62	DEL: 19-Jun-17 AL: 09-Jul-17

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ELEC-001	Trazo y localización de red de distribución.	est.	N/A	N/A	10.00	



OBRA:				
AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS REMEDIOS				
ESTIMACIÓN N	CONTRATO	MONDO TONTRATADO SIN IVA	MONTO DE ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE ESTIMACIÓN
1	OP-SJR-R33-005/2017	\$280,333.62		DEL: 19-jun-17 AL: 08-jul-17

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ELEC-002	Cepa para poste de 12.00 m.	028	N/A	N/A	8.00	



6

9

OBRA:				
AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS REMEDIOS				
ESTIMACION N	CONTRATO	MONDO CONTRATADO SIN IVA	MONTO DE ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE ESTIMACIÓN
1	CP-SJR-R33-005/2017	\$280,333.62		DEL: 19-jun-17 AL: 09-jul-17

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ELEC-003	Cana para poste de 9.00 m.	pza	N/A	N/A	4.00	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBRA:				
AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA COLONIA LOS REMEDIOS				
ESTIMACION N	CONTRATO	MONDO CONTRATADO SIN IVA	MONTO DE ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE ESTIMACIÓN
1	OP-SJR-R23-005/2017	\$280,333.62		DEL: 19-jun-17 AL: 09-jun-17

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ELEC-004	Excavación de ceba para ancla de retenida (de ancla o anclada).	m ³	N/A	N/A	4.00	



SP

Q

OBRA:				
AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS REMEDIOS				
ESTIMACIÓN N	CONTRATO	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO DE ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE ESTIMACIÓN
1	OP-SJR-R33-005/2017	\$280,333.62		DEL: 19-jun-17 AL: 09-jul-17

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ELEC-005	Suministro y colocación de POSTE DE CONCRETO PCR 12-750, en terreno tipo "C". Incluye: aviso de prueba, materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	N/A	N/A	6.00	




SD

Q

OBRA:				
AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS REMEDIOS				
ESTIMACION N	CONTRATO	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO DE ANTICIPO CON IVA	PERIODO DE ESTIMACIÓN
1	OP-SJR-R33-005/2017	\$280,333.62		DEL: 19-jun-17 AL: 09-jul-17

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ELEC-006	Suministro y colocación de POSTE DE CONCRETO PCR S-750, en terreno tipo "C". Incluye: aviso de prueba, materiales, flete, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	pza	N/A	N/A	4.00	

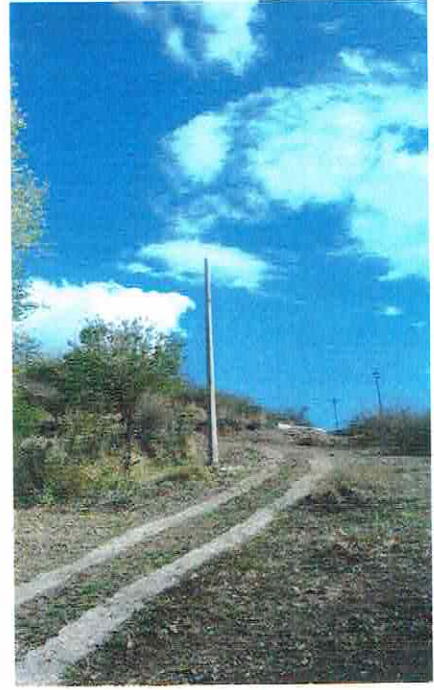

CP

Q
